



ALSA CITY BUS RABAT SALE TEMARA SA

Expertise Indépendante

Version Définitive

28 Juillet 2021


Confidentiel

Sommaire

	Page
1 Executive summary	4
1.1 Contexte de la mission.....	4
1.2 Analyse des événements ayant altéré l'équilibre économique de la convention :	5
1.3 Principaux constats.....	6
1.4 Calcul de la compensation	6
2 Contexte et périmètre de la mission.....	9
2.1 Contexte de la mission.....	9
2.2 Méthodologie et déroulement de la mission	10
2.3 Limitations liées à notre intervention	11
3 Diagnostic financier de la société.....	12
3.1 Analyse des performances de la société :	12
3.2 Analyse des réalisations Vs prévisions	13
4 Analyse du contrat de gestion déléguée.....	22
4.1 Cadre juridique applicable à la société.....	22
4.2 Analyse juridique des dispositions de la Convention pouvant justifier le bouleversement des conditions économiques du contrat	24
5 Mécanismes d'estimation de la compensation.....	28
5.1 Méthode de compensation	28
5.2 Calcul de la compensation	29

Annexes

Annexe 1 - Analyse des réalisations Vs prévision sur la période considérée	p.32
Annexe 2 - Evolution des taux de réalisation mensuel par activité	p.33
Annexe 2 - Comparatif des hypothèses avec données SPC	p.34
Annexe 2 - Calcul du TRI Induit	p.35

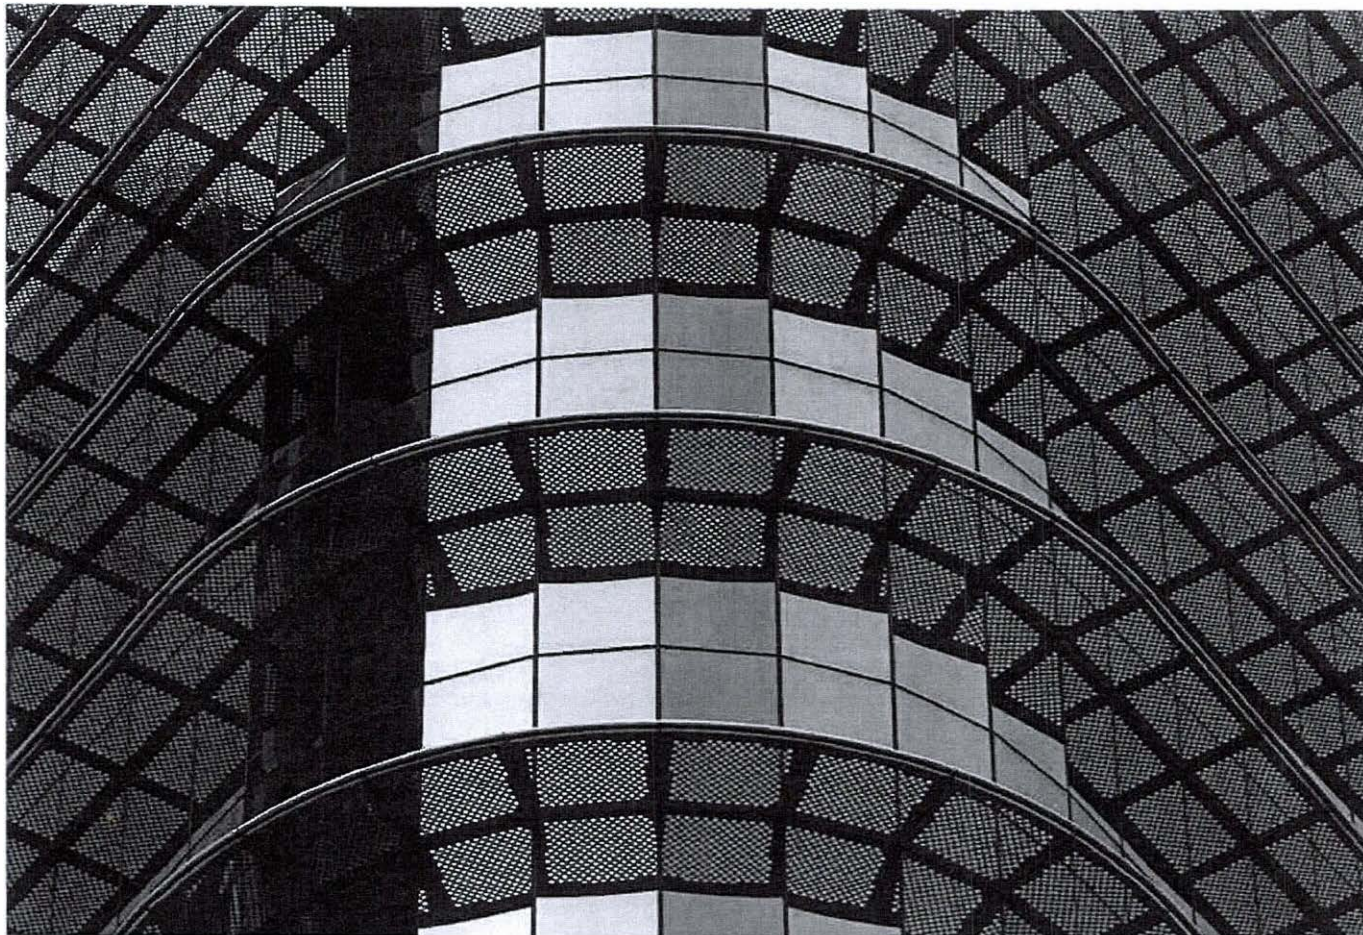

EXECUTIVE SUMMARY

1 Executive summary

1.1 Contexte de la mission

La société Alsa City Bus Rabat Salé Temara SA, identifiée dans la suite du rapport comme « ACB », a été adjudicataire en 2018, du service de transport de l'agglomération de Rabat-Salé-Témara.

La société a démarré son activité le 21 Août 2019 avec la mise en service de 350 autobus, conformément aux dispositions contractuelles.

Le chiffre d'affaires de la société est composé principalement de la vente des titres de transport et des abonnements mensuels pour étudiants, selon les tarifs fixés conformément aux dispositions contractuelles.

L'observation de l'évolution des trafics depuis le début d'exploitation a fait émerger des préoccupations nouvelles ayant révélé un risque commercial lié aux recettes, en particulier celui qui concerne la vente des abonnements en déphasage total avec les prévisions.

La situation de la société s'est aggravée aussi avec la crise sanitaire du Covid 19, entraînant ainsi des pertes importantes.

Dans ce contexte, la société a sollicité le cabinet Mazars afin d'effectuer une expertise indépendante dans le cadre de l'activation de la clause 72 du contrat de gestion déléguée, faisant appel à l'équilibre économique de l'opérateur (ACB).

Les conclusions de ce rapport ont été basées sur une analyse des réalisations de la société par rapport aux projections retenues lors de la signature de la convention de gestion déléguée.

1.2 Analyse des événements ayant altéré l'équilibre économique de la convention :

Analyse des éléments ayant altéré l'équilibre économique et financier de la convention

Eléments impactant l'équilibre économique du contrat	Commentaires	Compensation justifiée	Article
Impact Covid			
Les restrictions des déplacements de la population pendant la période de confinement	Les restrictions de déplacement durant le confinement ont impacté significativement la société : ▪ Confinement de la population ▪ Interdiction d'utiliser les moyens de transport privés et publics entre les villes ▪ Interdiction de déplacement nocturne La société a réduit sa flotte de 65% pour circuler avec 157 autobus.	Oui	Article 72
Les capacités limitées de transport (50% puis de 75% de Juin 2020 jusqu'au Avril 2021).	En respect des mesures de restrictions imposées par le ministère de l'intérieur, la société a vu sa capacité de transport limitée à 50% puis 75% de Juin à Avril 2021	Oui	Article 72
Baisse significative du nombre d'abonnés en raison de la fermeture des universités et écoles supérieures jusqu'à la de l'année scolaire 2021.	Lancement de l'opération d'enseignement à distance des étudiants et élevés. Les universités ont maintenu la fermeture depuis Mars 2020.	Oui	Article 72
Autres points ayant un impact sur l'équilibre économique et financier de la convention			
Recettes publicitaires	Manque à gagner sur les recettes publicitaires en raison des vinyles des bus non adaptés à la location d'espaces publicitaires	Oui	Article 72, Article 3 & 29
Risque commercial sur les ventes des abonnements	Des réalisations déconnectées par rapport à la réalité (manque des étudiants par rapport aux prévisions et données communiquées dans l'appel d'offre).	Oui Mais ne peut se faire qu'à travers un avenant au contrat	Article 56
Changement de la décomposition des trafics entre les lignes urbaines et régionales	L'observation des évolutions des trafics depuis le début d'exploitation ont fait émerger des préoccupations nouvelles ayant révélé que le mixte des voyageurs Urbains et régionaux a changé par rapport aux prévisions initialement établies. La société se retrouve à gérer des trajets plus longs (plus de 23 Km en moyenne) avec des flux de passagers plus importants (45%) issus des régions.	Oui Mais ne peut se faire qu'à travers la révision du contrat (Changement de prix n'est envisagé que dans le cas d'un avenant à la convention)	Article 56 Article 53.7
Pour les investissements			
Dépenses imprévues d'investissement	Le changement de couleurs des bus à deux reprises suite aux exigences de l'autorité. L'achat de 52 Bus Mercedes au lieu de Scania à un prix supérieur pour répondre aux exigences de démarrage imposées par l'autorité délégante.	Oui	Article 72

1.3 Principaux constats

La société a connu des performances négatives avec un déficit cumulé de 114,5 MMAD en 20 mois d'exploitation (De Septembre 2019 à Avril 2021), en raison particulièrement des restrictions sanitaires imposées par le Gouvernement durant la période du Covid (Confinement, restrictions des déplacements inter-villes, limitation des capacités de transport entre 50% et 75% depuis la levée du confinement ...).

Les résultats enregistrés sont dus essentiellement à un volume d'affaires insuffisant pour couvrir la totalité des charges d'exploitation. En effet la société a enregistré durant cette période :

- **Plus de 34,7 Millions** de passagers en moins par rapport aux prévisions, enregistrés essentiellement à partir de Mars 2020 ;
- **Plus de 30 Millions** de nombre de passagers abonnement en moins par rapport aux prévisions (31% des réalisations en volume d'affaire sur toute la période. *CF : Tableau 4*) ;
- **Plus de 214 MMAD** de manque à gagner en terme de chiffre d'affaires en 20 mois d'activité.
- **Un TRI projet calculé sur la base des résultats enregistrés sur 20 mois d'exploitation est de 5,9% en déphasage de 4 points de pourcentage par rapport au TRI cible** (En raison de la faiblesse des réalisations ainsi que des imprévus en matière d'investissement pour un montant de 15 MMAD).

1.4 Calcul de la compensation

La compensation financière doit être calculée, à notre avis, sur la base des manques à gagner enregistrés entre les projections et les réalisations.

A cet effet, nous avons retenu pour le calcul de la compensation les paramètres suivants :

- Le manque à gagner enregistré sur le chiffre d'affaires publicité ,
- Le gap enregistré en matière d'EBITDA (hors leasing & DEA), étant donné que cet indicateur est plus représentatif en terme de perte enregistrée par rapport aux moyens engagés par la société.

- Le dépassement des engagements en matière d'investissement.

Nous avons à cet effet estimé le montant de la compensation à **45 MMAD**, détaillé comme suit :

Calcul de la compensation	2019	2020	2021	Total
Produits de Publicité	1 184	3 606	1 220	6 010
Manque à gagner en terme d'EBITDA	-	17 151	6 474	23 626
Dépassement en Investissement	15 438			15 438
Manque à gagner	16 623	20 757	7 694	45 074

A noter que cette estimation ne prend pas en considération l'impact du changement de la décomposition des flux de passagers entre les périmètres urbain et périurbain (Plus de 19% des flux de passagers péri-urbain par rapport aux hypothèses initialement retenues).

En conclusion, nous estimons que le manque à gagner sur le point précité, conjugué au maintien des restrictions sanitaires et le risque commercial sur les abonnements étudiants, pourront avoir des impacts importants sur la trésorerie et la rentabilité future de la société, ainsi que sur le TRI projet qui pourrait enregistrer des niveaux faibles voir négatifs dans les prochaines années.


A cet effet, un rééquilibrage du contrat s'impose, à minima, en application des clauses contractuelles prévues au niveau de l'article 72 de la convention de gestion déléguée.

Naoufal EL KHATIB

Partner



Expertise Indépendante

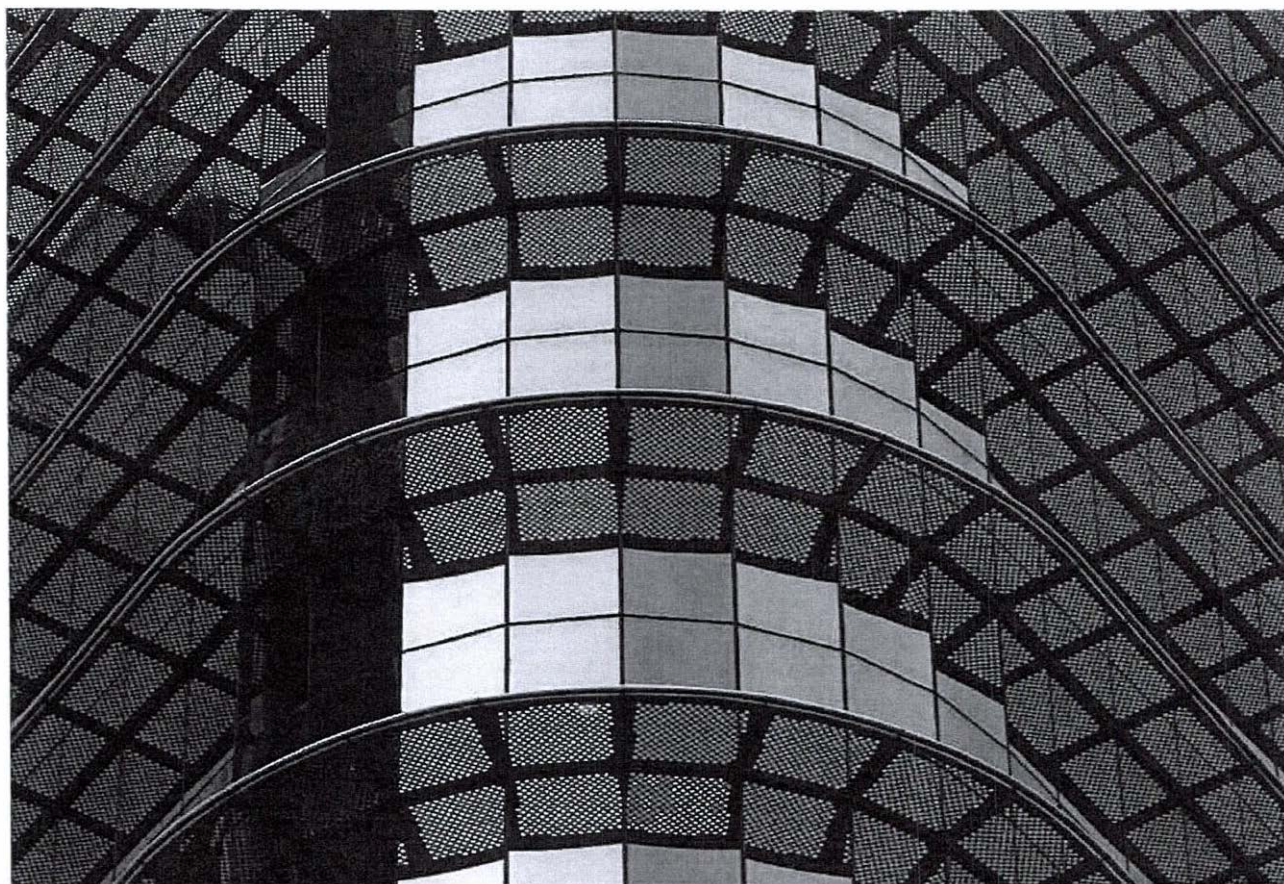

2 Contexte et périmètre de la mission

2.1 Contexte de la mission

La société ACB a été mandatée en Août 2018 par l'Etablissement de Coopération Intercommunale « Al Assima » pour l'exploitation de façon exclusive du service de transport public par autobus de l'agglomération de Rabat, Salé et Témara y compris le transport scolaire et universitaire assuré sur la base d'abonnement.

La société a démarré son activité le 21 Août 2019 avec la mise en service de plus 350 autobus à partir de la première année. Le tarif des tickets a été fixé à cinq dirhams au cours des premières années de l'exploitation.

Néanmoins, l'activité de la société a été mise à mal par la crise liée à la pandémie du Covid 19, venant altérer les prévisions initialement prévues au niveau du contrat de gestion déléguée et cela s'est traduit au niveau du chiffre d'affaires, du résultat et des différents indicateurs financiers.

En effet, la société a été contrainte, avec les mesures imposées par les restrictions sanitaires, de suspendre ses services sur plusieurs lignes ou/et de réduire ses capacités de transport à moitié (Arrêt des bus, limitation des accès, restriction au maximum des déplacements des citoyens ...). Aussi, la société a rencontré des conditions différentes à ceux prévu dans les prévisions inclus dans le business plan contractuel.

Dans ce sens, le Management de la société a sollicité le cabinet Mazars afin de réaliser une expertise indépendante afin d'estimer l'impact de la crise sur les réalisations de la société et par rapport aux prévisions initialement établies lors de la signature de la convention.

Cette mission a été réalisée à travers un diagnostic financier indépendant, portant sur une :

- Analyse financière de l'équilibre financier de la société avec un focus sur la période impactée par Covid-19 ;
- Mise en avant des principaux points (Red-Flags) ayant altéré l'équilibre financier et économique du contrat de gestion déléguée ;
- Analyse juridique des dispositions de la Convention pouvant justifier le droit de compensation et le rééquilibrage du contrat ;
- Estimation de la compensation financière permettant de rétablir l'équilibre économique de la convention et proposition de recommandations

2.2 Méthodologie et déroulement de la mission

2.2.1 Approche méthodologique :

Cette mission a couvert les éléments suivants :

- Revue des dispositions contractuelles prévues dans la convention de gestion déléguée et mise en évidence des clauses traitant la compensation ;
- Analyse financière des différents agrégats financiers de la société sur la période 2019-2021.
- Analyse de l'évolution du chiffre d'affaires et la structure des charges de la société sur la période considérée ;
- Revue des hypothèses de développement de l'activité retenues au niveau de la convention de gestion déléguée ;
- Analyse financière de l'équilibre financier de la société avec un focus sur la période impactée par Covid-19 ;
- Mise en avant des principaux points ayant altéré l'équilibre financier et économique du contrat de gestion déléguée ;
- Estimation de la compensation financière permettant de rétablir l'équilibre économique de la convention et proposition de recommandations pour le rééquilibrage du contrat.

2.2.2 Déroulement de la mission

Nos diligences ont été menées principalement sur la base des informations collectées à travers :

- Les documents transmis par voie électronique préalablement au démarrage de la mission;
- Les entretiens et réunions de travail menés avec le management de la société.

2.3 Limitations liées à notre intervention

2.3.1 Limitations d'ordre général :

Nos travaux ont été menés uniquement pour votre information dans le contexte de la mission. Ils ne constituent ni un audit ni une revue limitée des comptes de la société mais relèvent de procédures convenues. La direction de la société demeure seule responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations qui nous ont été transmises, notre intervention se limitant à porter à votre attention les conclusions factuelles résultant de nos travaux.

Les limitations générales sur l'ensemble de nos travaux se résument comme suit :

- Nous avons revu l'information qui a été mise à notre disposition et avons réalisé les investigations usuelles pour vérifier la conformité des informations fournies. Nous n'assumons en conséquence aucune responsabilité sur la réalité, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information communiquée.
- Notre travail doit être interprété avec une prise en compte d'un niveau raisonnable de matérialité en relation avec notre expérience dans ce type de missions.

3 Diagnostic financier de la société

3.1 Analyse des performances de la société :

La société a connu des performances négatives depuis le début de l'activité avec un déficit important qui s'est établi à 114 MMAD sur la période considérée (Dont 73 MMAD en un seul exercice), en raison particulièrement des restrictions sanitaires imposées par l'Etat durant la période du Covid (Confinement, restrictions des déplacements inter-villes, limitation des capacités de transport à 50% ...).

Le tableau de formation des résultats de la société sur la période entre 2019 et 2021 se présente comme suit :

Compte de résultat en KMAD	2 019 4 mois	2 020 12 mois	2 021 4 mois
Vente de marchandises	451	1 304	766
Vente de biens&services produits	85 803	211 994	66 173
Autres produits d'exploitation	2 522	2 491	976
Chiffre d'affaires	88 777	215 789	67 915
Achats revendus de marchandises	(211)	1 165	(4)
Achats consommés de matières et fournitures	(35 363)	(75 797)	(23 508)
Marge Brute	53 202	141 157	44 403
Autres charges externes	(14 757)	(50 817)	(16 348)
Impôts et taxes	(802)	(2 041)	(506)
Charges de personnel	(38 057)	(98 465)	(26 944)
EBITDA	(414)	(10 166)	605
Reprises d'exploitation	796	-	-
Dotation aux Am.	(35 093)	(95 217)	(23 323)
EBIT	(34 711)	(105 384)	(22 718)
Résultat financier	(233)	2 190	(1 317)
Résultat non courant	10 843	31 179	7 359
Impôt sur les sociétés	(667)	(1 093)	-
Résultat net	(24 767)	(73 107)	(16 676)
En % du CA			
Taux de marge brute	60%	65%	65%
Marge d'EBITDA	0%	-5%	1%
EBIT / CA	-39%	-49%	-33%
Marge nette	-28%	-34%	-25%

Tableau 1 : Compte de résultat sur la période 2019-2020

La lecture des comptes de résultat de la société permet de relever les observations suivantes :

- Une société est déficitaire sur toute la période considérée avec un cumul des déficits de 114,5 MMAD sur les 20 mois d'exercice ;
- Un volume d'affaires insuffisant pour couvrir la totalité des charges d'exploitation en particulier les charges de structure qui représentent en moyenne plus de 65% du chiffre d'affaires.

- A noter que la société a été fortement impactée par les restrictions imposées par les Autorités entraînant ainsi :
 - La réduction de la flotte en circulation de 65% durant la période de confinement.
 - La fermeture des écoles et universités. Ces dernières ont maintenu la fermeture jusqu'à ce jour entraînant une baisse significative des abonnements de la société

3.2 Analyse des réalisations Vs prévisions

L'analyse comparative entre les réalisations et les prévisions, définies dans le business plan contractuel, a pour objectif de définir les points du déséquilibre économique et financier du contrat de la gestion déléguée.

Cette analyse mettra le point sur :

- Les réalisations en terme de nombre de passagers (tickets & abonnements) ;
- L'évolution des réalisations du chiffre d'affaires par rapport aux prévisions initiales et les points entraînant ce gap ;
- Le différentiel en terme de réalisation des charges d'exploitation (hors amortissement) par rapport aux hypothèses prévues ;
- La décomposition des flux de passagers entre les lignes urbaines et péri-urbaines ;
- Les réalisations de la société en terme d'EBITDA (hors leasing) par rapport aux prévisions initiales convenues lors de la signature de la convention. Le choix de cet indicateur a été fait en prenant en considération la rentabilité financière du cycle d'exploitation de la société, indépendamment de sa politique de financement et d'investissement. Aussi, les hypothèses retenues initialement prévoient des déficits sur les 5 premières années, ce qui rend difficile l'exercice de comparaison.
- Les réalisations en terme d'investissements par rapport aux prévisions.

L'analyse de ces différentes composantes nous permettra d'estimer le TRI induit, par rapport au TRI Cible, calculé sur la base des réalisations enregistrées sur la période Septembre 2019 – Avril 2021 et les dépassements en terme d'investissement par rapport aux prévisions escomptées (CF : Annexe 4 : Calcul du TRI induit).

Il ressort de cette analyse ce qui suit :

3.2.1 De faibles réalisations en terme de nombre de passagers par rapport aux prévisions :

L'analyse de l'évolution des réalisations par rapport aux projections du nombre de passagers fait ressortir un écart important en nombre de passagers par rapport aux hypothèses retenues, dont le détail se présente comme suit :

Réel Vs BP	2019 (4mois)			FY2020			2021 (4mois)			Total
Passagers (En Milliers)	Réel	BP	Gap	Réel	BP	Gap	Réel	BP	Gap	Gap
Nombre de ticket	17 150	18 182	(1 032)	46 454	75 126	(28 673)	19 138	24 200	(5 062)	(34 766)
Nombre de passagers abonnement	1 369	7 248	(5 879)	991	18 198	(17 207)	741	7 732	(6 991)	(30 078)

Source : Management de la société

Tableau 2 : Comparatif du nombre de passagers (réalisations Vs prévisions)

A noter que ce gap a été constaté en particulier sur l'exercice 2020. Un exercice où la société a subi les retombées des restrictions sanitaires imposées par les autorités.

Pour les abonnements d'étudiants, le manque à gagner est aussi important avec 31% de réalisations sur toute la période y compris l'exercice 2019 où la société a enregistré 56% des prévisions (Exercice non impacté par le Covid. Cf: tableau 4).

En effet, la société a connu des difficultés majeures pour développer ce produit en raison de :

- La déconnexion des hypothèses retenues initialement avec les réalisations ;
- La fermeture des écoles et universités depuis le 20 mars 2020 entraînant ainsi la chute des abonnements.

Le graphique suivant présente de façon détaillée l'analyse des réalisations mensuelles par activité sur la période Septembre 2019 – Avril 2021

Taux de réalisation mensuel par produit

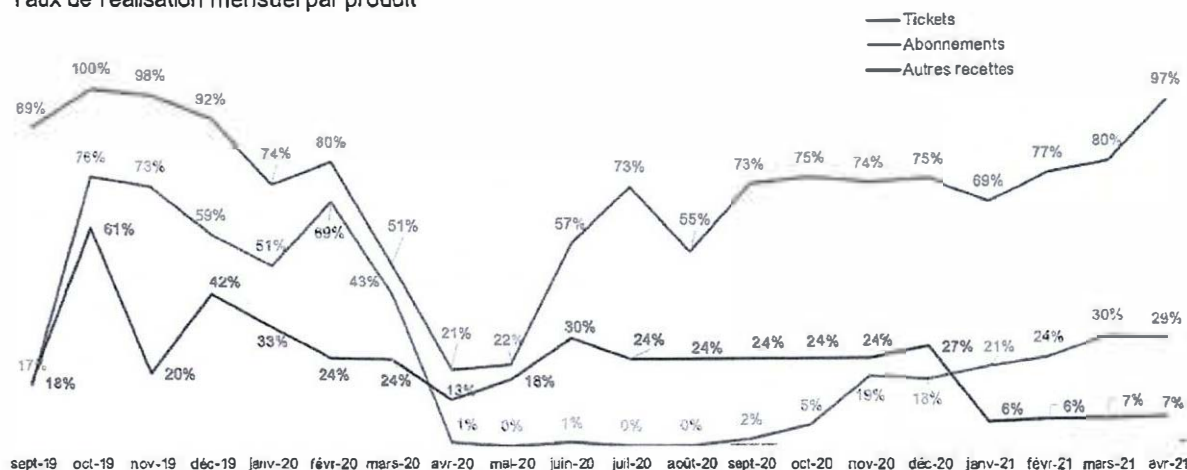


Figure 3 : Taux de réalisation mensuel par produit

3.2.2 Un Gap de 214 Millions de chiffre d'affaires par rapport aux prévisions :

L'analyse des réalisations en terme de ventes se présente comme suit :

GAP de chiffre d'affaires	2019	2020	2021	Total
KMAD	4 mois	12 mois	4 mois	20 mois
Chiffre d'affaires réalisé				
CA Tickets	75 621	204 228	84 068	363 916
CA abonnements	6 726	6 403	3 279	16 408
CA Autres recettes	1 857	3 854	347	6 058
Publicité				
Total	84 203	214 485	87 694	386 382
Chiffre d'affaires prévisionnel				
CA Tickets	79 747	329 502	106 140	515 389
CA abonnements	11 921	28 366	12 614	52 902
CA Autres recettes	5 264	16 030	5 424	26 718
Publicité	1 184	3 606	1 220	6 010
Total	98 117	377 504	125 398	601 019
GAP	(13 914)	(163 019)	(37 704)	(214 636)
Taux de réalisation				
CA Tickets	95%	62%	79%	71%
CA abonnements	56%	23%	26%	31%
CA Autres recettes	35%	24%	6%	23%
Chiffre d'affaires Global	86%	57%	70%	64%

Tableau 4 : GAP en terme de chiffre d'affaires

Les réalisations de la société ont connu une baisse importante sur la période considérée avec un taux de réalisation de 64% par rapport aux prévisions initialement convenues au niveau de la convention.

Le bridge suivant explicite le passage du chiffre d'affaires prévisionnel à celui réalisé par période :

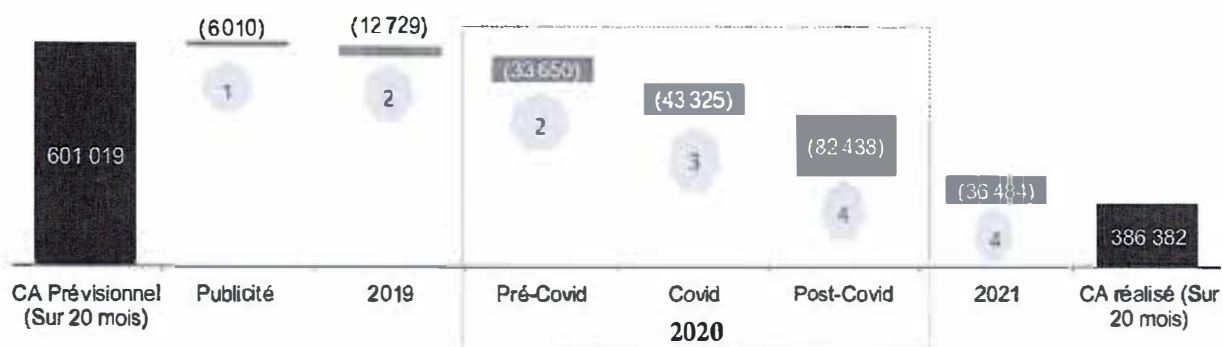


Figure 5 : bridge passage Chiffre d'affaires prévisionnel au Chiffre d'affaires réalisé sur 20 mois d'exploitation

- 1) Correspond à l'impact global de la publicité non générée durant toute la période
- 2) Correspond principalement aux faibles réalisations en terme de vente d'abonnements étudiants.
- 3) Correspond à l'impact des restrictions de déplacement sur les 2 mois de confinement (Impact de 65% de la flotte en arrêt & la perte totale des ventes d'abonnement)
- 4) Correspond à 25% de moins par rapport aux réalisations post Covid (maintien des restrictions après le confinement et la fermeture des universités).

Par catégorie de prestation, nous avons noté des taux de réalisation en déconnexion avec les hypothèses retenues en particulier :

- Pour les ventes de ticket : un taux de réalisation global de 71% avec un impact plus important en 2020 où la société a réalisé un taux de 22% sur la période de confinement et 75% en moyenne à partir de Juin 2020 (CF : Figure 3);
- Pour les abonnements : un taux de réalisation moyen de 30% en déphasage par rapport aux prévisions retenues. Ce constat a été observé bien avant la période de confinement (56% en 2019).

En terme de revenus, un manque à gagner de 214 MDH décortiqué comme suit :

- Un manque à gagner de 151 MMAD sur la vente des tickets, représentant 30% des prévisions non réalisées. Ce gap a été enregistré à partir du mois de Mars 2020 avec les restrictions de déplacements imposées par les autorités.

- Un gap de 36 MMAD sur les abonnements en raison de la fermeture des écoles et universités et la déconnexion des hypothèses retenues ;
- Des réalisations en déphasage avec le business plan de 20 MDH sur les autres recettes, correspondant aux service spéciaux et transport de personnel ;
- Des recettes non réalisées sur la location des espaces publicitaires pour un montant global de 6 MDH. Selon le management de la société, cette dernière n'a pas pu réaliser ce chiffre d'affaires en raison des Vinyles mis dans l'arrière des bus selon le design prévu dans le cadre des accords convenus avec l'autorité délégante, rendant ainsi impossible de mettre du contenu publicitaire sur le bus. A noter que la société a engagé pour un montant total de 4,2 MMAD, plusieurs cabinets de conseil en marketing pour la mise en place d'une stratégie pour le développement de cette activité qui est restée en arrêt.

3.2.3 Des économies des coûts de 184 MMAD :

La société a enregistré aussi des économies durant toute la période considérée dont le détail se présente comme suit :

Comparatif de charges (hors Leasing & DEA)	2019	2020	2021	Total
En Kmad	4 mois	12 mois	4 mois	20 mois
Budget prévisionnel	96 670	321 809	104 338	522 818
Coûts engagés	75 050	189 301	74 329	338 680
Optimisation des coûts	21 620	132 508	30 010	184 138
Charge consommables	16 862	86 693	22 091	125 645
Charges de personnels	1 899	24 313	3 112	29 324
Frais généraux	2 859	21 502	4 807	29 168

Tableau 6 : Comparatif des charges engagées Vs charges prévisionnelles

(*) Les charges de leasing n'ont pas été prévues au niveau du business plan initial. A cet effet, le gap enregistré ne prend pas en considération les redevances leasing engagées durant cette période pour un montant global de 65,5 MMAD.

L'analyse du comparatif entre les coûts engagés et le BP prévisionnel fait ressortir des économies de 184 MDH durant la période considérée, correspondant principalement à :

- L'arrêt de plus de 65% de la flotte pendant une durée de 2 mois et leurs impacts sur les achats consommés pour un montant de 125 MMAD.
- L'adhésion de 1 273 employés au service de l'indemnité forfaitaire, financée par le fonds spécial de gestion de la pandémie Covid 19, ce qui a permis de soulager la

masse salariale durant 3 mois pendant la période de confinement pour un montant de 29 MMAD.

A noter par ailleurs, que nous avons retraité de l'EBITDA l'impact du leasing, non prévu au niveau du business plan. En effet, la société a acquis plus de 94 autobus par le leasing donnant lieu à une redevance mensuelle de 4,9 MMAD.

Nous considérerons aussi que le leasing reste un choix de la société, et vu que les termes du contrat concernent les parties exploitation et investissement et ne comprennent pas une composante financement, le leasing peut donc être considéré comme un élément financier et ne figure pas dans le calcul du gap et de la compensation. Ce point sera traité au niveau de la partie 5 (CF : Calcul de la compensation)

3.2.4 Un dépassement de 15 MMAD en terme d'investissement :

La société a respecté la totalité des engagements en terme d'investissement. En effet, il a été convenu un investissement prévisionnel de 595 MMAD.

A travers l'analyse des actifs immobilisés nous avons noté que la société a réalisé un dépassement de 15 MMAD correspondant principalement à des dépenses non prévues initialement au niveau de la convention, à savoir :

- Le changement de couleurs des bus à deux reprises suite aux exigences de l'autorité délégante, ce qui induit à une facture supplémentaire de 7 MMAD à la charge de la société.
- L'acquisition en urgence de 52 bus Mercedes au lieu de Scania avec un prix supplémentaire de 300 KMAD/Bus en raison des contraintes de lancement imposées par l'autorité délégante.

Le tableau suivant présente de façon détaillée les investissements réalisés par rapport aux engagements :

Dépassements en investissement - Parc Autobus			
KMAD	Quantité	Prix unitaire	Total
Plan prévisionnel d'investissement (1)	350	1 700	595 125
Low entry 12 metres Scania	200	1 554	310 700
18 metres articulé MB	50	2 689	134 425
Bus subventionnés	100	1 500	150 000
Investissements réalisés (2)	350	1 744	610 563
Low entry 12 metres Scania	148	1 435	212 336
Low entry 12 metres Mercedes	52	1 968	102 336
18 metres articulé MB	50	2 776	138 788
Bus subventionnés	100	1 500	150 000
Imprévus			
Peinture changement couleur bus	248		5 478
Frais matriculation (2020)	248		1 626
Total des dépassements (2) - (1)			15 438

Tableau 7 : Dépassements en terme d'investissement

3.2.5 Perte de 4 points de pourcentage par rapport au TRI cible :

Le contrat de gestion déléguée se base sur un ensemble d'hypothèses qui garantissent l'équilibre économique global de la convention en particulier un TRI projet de 9,9% au terme de la 15^{ème} année d'exploitation.

Afin d'estimer l'impact de cette période sur le TRI projet, nous avons pris en considération les éléments suivants :

- Les réalisations enregistrées par la société sur la période étudiée (Septembre 2019 à Décembre 2020)
- Les résultats réalisés à fin Avril 2021 ont été multipliés par 3 pour estimer un Forecast 2021 en prenant comme hypothèse la continuité des restrictions sanitaires jusqu'à fin 2021 (Couvre-feu nocturne, limitation du taux d'occupation des bus à 75% de leurs capacités ...ect).
- Maintien des mêmes hypothèses retenues initialement sur la période restante (13 ans);
- Les dépassements en matière d'investissement pour un montant de 15 MMAD
- La prise en compte des acquisitions de bus financées par leasing au niveau des investissements de la première année et retraitement des redevances de l'EBITDA en intégrant l'impact de l'amortissement de ces immobilisations sur toute la période au niveau des dotations ;

A travers cette analyse nous avons estimé le TRI induit à 5,9% en déphasage de 4 points de pourcentage par rapport au TRI Cible (CF annexe 4 : Calcul du TRI projet).

TRI recalculé	
TRI prévisionnel	9,9%
TRI calculé	5,9%
Gap	4,0%

Ce gap est dû principalement à plusieurs éléments de déséquilibre économique et financier de la convention, à savoir :

- Un nombre de passagers (tickets & abonnements) largement inférieur à celui prévu au niveau du contrat ;
- Des restrictions sanitaires entraînant une baisse importante des recettes ;
- Des espaces publicitaires non utilisés ;
- Et aussi le changement de la décomposition des trafics entre les lignes urbaines et régionales (Le mixte des voyageurs entre les passagers urbains et les passagers régionaux). En effet, les prévisions ont été fixées sur la base d'un prix fixe de 5 Dhs quel que soit le trajet et pour toutes les lignes avec un niveau de passagers plus important sur les lignes urbaines 61% contre 31% pour les lignes régionales.

Cette répartition garantissait à la société de récupérer les pertes enregistrées sur les lignes régionales de par leur longueur (Plus de 23 Km en moyenne).

Néanmoins la quote-part des voyageurs sur les lignes péri-urbaines a progressé de 19% à fin Mai 2021 ce qui a réduit significativement le revenu kilométrique par ligne.

Le tableau suivant présente de façon détaillée le changement de la décomposition des flux de passagers entre les lignes avec :

- Plus de 46% de flux émanant des lignes régionales au lieu de 31% prévu au niveau du business plan
- 54% des flux enregistrés au niveau des lignes urbaines au lieu de 61% prévu initialement.

Récapitulatif	Ligne	2019 (4mois)			2020 (FY)			2021 (5 mois)		
		Réel	BP	Diff	Réel	BP	Diff	Réel	BP	Diff
Nombre de Passagers	Régional	7 626 842	7 743 571	(116 729)	21 030 401	29 081 184	(8 050 783)	10 987 579	12 627 814	(1 640 235)
	Urbain	10 458 035	12 260 654	(1 802 619)	25 423 310	46 045 207	(20 621 897)	12 774 274	19 994 038	(7 219 764)
Poids par Type	Régional	42%	39%	9%	45%	39%	17%	46%	39%	19%
	Urbain	58%	61%	-6%	55%	61%	-11%	54%	61%	-12%

Source : Management de la société

Tableau 8 : Récapitulatif des réalisations par catégorie de ligne

4 Analyse du contrat de gestion déléguée

Cette partie sera consacrée dans un premier lieu à l'analyse de la convention de gestion déléguée et des dispositions légales prévues pour le calcul de la compensation et dans une deuxième partie à l'analyse juridique des dispositions légales pouvant justifier le bouleversement des conditions économiques du contrat.

4.1 Cadre juridique applicable à la société

4.1.1 Présentation

La société a signé un contrat de gestion déléguée fixant les spécifications techniques, juridiques et financières en relation avec l'exécution de la mission de service public de transport par autobus dans l'agglomération de Rabat Salé et Témara.

A travers ce contrat, la société ABC est autorisée à gérer et exploiter le réseau du transport urbain et périurbain en contrepartie de l'application d'un tarif unique pour les tickets et les abonnements, tel que prévu par l'annexe 4 de la convention.

La société est également autorisée à exploiter des prestations de services annexes, tels que la location d'espace publicitaires sur les autobus et sur les titres de voyages (Article 3 de la convention).

En parallèle la convention prévoit un investissement de 687 Millions de Dhs, correspondant à :

- L'acquisition de plus de 350 autobus dès la première année d'exploitation (dont 100 bus ont été financés par subvention accordée par l'autorité délégante), 30 autobus la 2^{ème} année et 10 bus/an sur 5 ans à partir de la 4^{ème} année ;
- L'aménagement des stations d'arrêts ;
- L'aménagement et constructions des équipements des ateliers
- Autres investissements.

4.1.2 Constats :

Dans le cadre de cette convention le délégataire assure les engagements en terme d'investissement, supporte le risque commercial (sur les recettes) et industriel (les coûts) et ne reçoit aucune subvention pour assurer l'équilibre du budget prévisionnel.

Dans ce cas de figure, l'exploitant applique une tarification fixe quelque soit le niveau de fréquentation des autobus et le niveau du trafic. Aucune précision n'est apportée sur la méthode de compensation susceptible d'équilibrer le budget prévisionnel de la société en cas d'un déficit des réalisations.

En effet, l'article 56 a prévu des dispositions permettant à la société d'exiger des mesures d'adaptation du contrat en cas d'événements extérieurs, ayant une incidence significative sur les recettes ou/et les dépenses, notamment :

- Les modifications législatives et/ou réglementaires pesant significativement sur les droits et obligations des parties ;
- La variation significative de la politique de déplacement ayant un impact direct sur le kilométrage commercial ;
- La suppression ou la création de nouveaux impôts

La convention a aussi prévu un article traitant les modalités de modification du contrat due à des bouleversements des conditions économiques (Article 72).

Néanmoins, ces articles ne font pas état de la méthode de compensation à prévoir pour l'indemnisation de la société des préjudices subis.

La seule méthode prévue au niveau de la convention concerne la compensation prévue au niveau de l'article 53.3, correspondant à la mise en œuvre des augmentations tarifaires. Cet article, fait état d'une méthode de compensation basée sur un comparatif des projections financières objet de l'annexe 4 et des bilans établis par la société. Cette méthode est appliquée dans le cas où le délégataire surseoirait à la mise en œuvre d'une augmentation tarifaire sur demande du délégant.

Nous avons à cet effet, pris en considération cette méthode pour l'estimation des manques à gagner subis par la société depuis le début de l'exploitation. Cette estimation est basée sur

une comparaison des projections financières et des réalisations de la société sur la période 2019-2021.

4.2 Analyse juridique des dispositions de la Convention pouvant justifier le bouleversement des conditions économiques du contrat

L'émergence de la pandémie du COVID 19 conduit à s'interroger sur les méthodes éventuelles de compensation qui permettraient de mesurer l'impact de cette crise sur la société et les résultats prévisionnels.

Nous avons à cet effet, analysé les éléments ayant impactés la société durant cette période et le bouleversement économique ayant altéré les termes du contrat de gestion déléguée. Le tableau suivant présente de façon détaillée les différents événements avec un renvoi des articles de la convention permettant de justifier ou non la compensation.

Analyse des éléments ayant altéré l'équilibre économique et financier de la convention			
Eléments impactant l'équilibre économique du contrat	Commentaires	Compensation justifiée	Article
Impact Covid			
Les restrictions des déplacements de la population pendant la période de confinement	Les restrictions de déplacement durant le confinement ont impacté significativement la société : • Confinement de la population • Interdiction d'utiliser les moyens de transport privés et publics entre les villes • Interdiction de déplacement nocturne La société a réduit sa flotte de 65% pour circuler avec 157 autobus.	Oui	Article 72
Les capacités limitées de transport (50% puis de 75% de Juin 2020 jusqu'au Avril 2021).	En respect des mesures de restrictions imposées par le ministère de l'intérieur, la société a vu sa capacité de transport limitée à 50% puis 75% de Juin à Avril 2021	Oui	Article 72
Baisse significative du nombre d'abonnés en raison de la fermeture des universités et écoles supérieures jusqu'à la de l'année scolaire 2021.	Lancement de l'opération d'enseignement à distance des étudiants et élèves. Les universités ont maintenu la fermeture depuis Mars 2020.	Oui	Article 72
Autres points ayant un impact sur l'équilibre économique et financier de la convention			
Recettes publicitaires	Manque à gagner sur les recettes publicitaires en raison des vinyls des bus non adaptés à la location d'espaces publicitaires	Oui	Article 72, Article 3 & 29
Risque commercial sur les ventes des abonnements	Des réalisations déconnectées par rapport à la réalité (manque des étudiants par rapport aux prévisions et données communiquées dans l'appel d'offre).	Oui Mais ne peut se faire qu'à travers un avenant au contrat	Article 56

Changement de la décomposition des trafics entre les lignes urbaines et régionales	L'observation des évolutions des trafics depuis le début d'exploitation ont fait émerger des préoccupations nouvelles ayant révélé que le mixte des voyageurs Urbains et régionaux a changé par rapport aux prévisions initialement établies. La société se retrouve à gérer des trajets plus longs (plus de 23 Km en moyenne) avec des flux de passagers plus importants (45%) issus des régions.	Oui Mais ne peut se faire qu'à travers la révision du contrat (Changement de prix n'est envisagé que dans le cas d'un avenant à la convention)	Article 56 Article 53.7
Pour les investissements			
Dépenses imprévues d'investissement	<u>Le changement</u> de couleurs des bus à deux reprises suite aux exigences de l'autorité. L'achat de 52 Bus Mercedes au lieu de Scania à un prix supérieur pour répondre aux exigences de démarrage imposées par l'autorité déléguée.	Oui	Article 72

(i) **Impact de la pandémie du COVID 19 :**

En raison de la pandémie du COVID-19, le gouvernement a établi d'importantes mesures de restrictions ayant pour objectif de réduire la mobilité des personnes, le fonctionnement des services de transport et les normes de distanciation physique. Ces restrictions ont eu des effets importants sur les recettes de la société en raison de :

- La fermeture des administrations, les écoles et universités durant toute la période du confinement ;
- L'interdiction des déplacements entre les différentes communes (Rabat, Salé et Témara) ;
- La réduction de la capacité des bus à 50% puis 75% après la période de confinement ;
- La prise en charge des dépenses de désinfection des autobus ;

A noter que la société a maintenu le service de transport de façon continue durant cette période à un nombre réduit de personnes autorisées à se rendre à leurs postes de travail (Personnel médical, la police, la gestion des déchets, la vente au détail d'aliments ou les pharmaciens, ou/et toutes personnes disposant d'autorisation de déplacement délivrée par les autorités compétentes...etc).

De par l'article 72 de la convention, cet événement peut constituer un événement extérieur au délégataire qui a eu des incidences significatives sur les recettes de la société et qui a altéré l'équilibre économique et financier de l'exploitation des services délégués, comme stipulé au niveau de l'article précité.

(ii) **Le risque commercial sur les hypothèses de ventes des abonnements :**

Ces hypothèses ont été basées sur le CPS communiqué par l'autorité délégante, comportant les réalisations de l'ancien exploitant (CF : Annexe 3).

Néanmoins ces prévisions ne prennent pas en compte le développement d'autres moyens de transports collectifs et la dégradation du service de transport engendrée par l'ancien exploitant.

Ce risque devrait faire l'objet d'une compensation en application des dispositions de l'article 56 de la convention qui intègre les contraintes d'ordre technique comme des événements externes à la société. Toutefois, les mesures de rétablissement de l'équilibre et financier initial du contrat ne peuvent donner lieu à une compensation qu'à travers l'établissement d'un avenant au contrat conformément aux dispositions de l'article susvisé.

(iii) **Autres points ayant un impact sur l'équilibre économique et financier de la convention :**

Suite à la revue des recettes de la société, nous avons relevé d'autres points qui ont eu un impact sur l'équilibre économique et financier de la convention, à savoir :

- Les difficultés rencontrées par la société pour offrir des prestations de publicité en raison des vinyles des bus non adaptés pour la mise en place de campagne publicitaire ; A noter que cette prestation a été prévue au niveau de l'article 3 & 29 de la convention.
- Le changement de la décomposition des fréquentations des lignes urbaines et régionales : ce point concerne les hypothèses retenues lors de la signature du contrat de gestion déléguée, avec une tarification fixe de 5 Dhs en prenant en considération un trafic plus important dans les zones urbaines (61%) permettant de compenser les pertes enregistrées sur les longs trajets (Plus de 23 Km). Néanmoins, la société enregistre mensuellement des flux plus importants sur les lignes régionales que sur les lignes urbaines (*Annexe 3*).

A cet effet, la variation significative de la politique de déplacement, ayant un impact direct sur le kilométrage commercial constitue un élément extérieur à la société et entraîne un manque à gagner en terme de recette et un risque industriel en terme de rentabilité des lignes.

(iv) **Engagement en terme d'investissements :**

Nous avons aussi noté un dépassement en terme d'investissement pour un montant de 15 MDH à raison de :

- Changement de couleurs des bus à deux reprises suite aux exigences de l'autorité, ce qui a induit une facture supplémentaire à la charge de la société.
- L'acquisition en urgence de 52 bus Mercedes au lieu de Scania avec un prix supplémentaire de 300 KMAD/Bus en raison des contraintes de lancement imposées par l'autorité délégante.

Dépassements en investissement - Parc Autobus			
KMAD	Quantité	Prix unitaire	Total
Plan prévisionnel d'investissement (1)	350	1 700	595 125
Low entry 12 metres Scania	200	1 554	310 700
18 metres articulé MB	50	2 689	134 425
Bus subventionnés	100	1 500	150 000
Investissements réalisés (2)	350	1 744	610 563
Low entry 12 metres Scania	148	1 435	212 336
Low entry 12 metres Mercedes	52	1 968	102 336
18 metres articulé MB	50	2 776	138 788
Bus subventionnés	100	1 500	150 000
Imprévus			
Peinture changement couleur bus	248		5 478
Frais matriculation (2020)	248		1 626
Total des dépassements (2) - (1)			15 438

Tableau 7 : Dépassements en terme d'investissement

Il convient de préciser dans ce sens que la société a convenu dans le cadre de ce partenariat un total investissement de 891 MMAD sur toute la période du contrat (Article 54).

Les imprévus en question sont réalisés indépendamment de la volonté de la société et non convenus lors de la signature de la convention, entraînant ainsi un impact négatif de 0,9 points de pourcentage par rapport au TRI cible (9,9%).

A la lecture de l'article 72 de la convention, les événements imprévus ayant un impact sur l'équilibre économique et financier de la convention doivent être corrigés par des mécanismes adéquats de manière à rétablir cet équilibre.

5 Mécanismes d'estimation de la compensation

5.1 Méthode de compensation

A la lumière de l'analyse des éléments de droit présentés ci-dessus, nous avons considéré que la compensation doit être calculée sur la base des hypothèses retenues par la convention garantissant ainsi l'équilibre économique de la prestation de service de transport.

A cet effet et pour garantir à la société le TRI prévisionnel convenu lors de la signature de la convention, la compensation financière doit être calculée sur la base des gaps enregistrés par la société.

A noter par ailleurs que nous avons retenu pour le calcul de la compensation les paramètres suivants :

- Le gap enregistré sur le chiffre d'affaires publicités étant donné que la société n'avait pas les moyens nécessaires pour le réaliser. En parallèle, a engagé des coûts de 4,2 MMAD pour la mise en place d'une stratégie marketing permettant de développer cette activité.
- Le gap enregistré en matière d'EBITDA, étant donné :
 - Que le gap en matière de Chiffre d'affaires a été occasionné par des optimisations et des économies de coûts réalisées sur la même période ;
 - Que l'EBITDA est plus représentatif en terme de perte enregistrée par rapport au moyen engagé par la société.
- Le dépassement des engagements en matière d'investissement

Il convient de préciser par ailleurs que nous n'avons pas pris en considération les subventions reçues sur les abonnements et l'impact des changements de la décomposition des trafics entre les lignes urbaines et régionales dans le cadre de cette compensation pour les raisons suivantes :

- Difficulté d'estimer le manque à gagner en relation avec la variation significative de la politique de déplacement (Entre lignes urbaines et régionales).

- En effet, le calcul de cette compensation prendra en considération un changement des tarifs par catégorie de ligne. Cette disposition ne pourrait être effectuée qu'à travers la mise en place d'un avenant au contrat conformément aux dispositions prévues au niveau de l'article 53-7

Focus sur les redevances de leasing

- La convention de gestion déléguée prévoit la remise à la valeur nette comptable des biens de retour (bus, équipements, guichets de ventes ...ect). Cette disposition constitue l'une des principales caractéristiques du contrat de gestion déléguée. Cette remise de biens à l'autorité délégante est partie intégrante du contrat de concession.
- A cet effet, l'ensemble des biens financés par l'exploitant doivent faire l'objet d'une prise en charge adaptée permettant la récupération des capitaux que celui-ci a engagés pour le financement ultime des immobilisations remises à l'autorité délégante.
- Cette prise en charge est traduite à travers un amortissement financier. Le montant de l'amortissement doit correspondre au montant de l'investissement réalisé par le concessionnaire.
- A noter dans ce sens que la société a financé l'acquisition de 94 bus par crédit-bail pour un montant global de 210 MMAD. D'un point de vue comptable, ces actifs ne sont pas comptabilisés en immobilisation et en même temps aucun amortissement n'est appliqué. La société comptabilise mensuellement des redevances de prêt de 4,9 MMAD, ces charges viennent en diminution des résultats de la société.
- A noter que ce mode de financement n'a pas été prévu au niveau du BP initial. A cet effet, la charge correspondante a été retraitée du calcul de l'EBITDA afin d'estimer l'impact économique des faibles réalisations de la société occasionnée essentiellement par la pandémie du Covid 19. Même retraitement a été effectué pour le calcul du TRI induit.

5.2 Calcul de la compensation

A la lumière des éléments présentés ci-dessous, le calcul de la compensation par nature de préjudice subi et par période se présente comme suit :

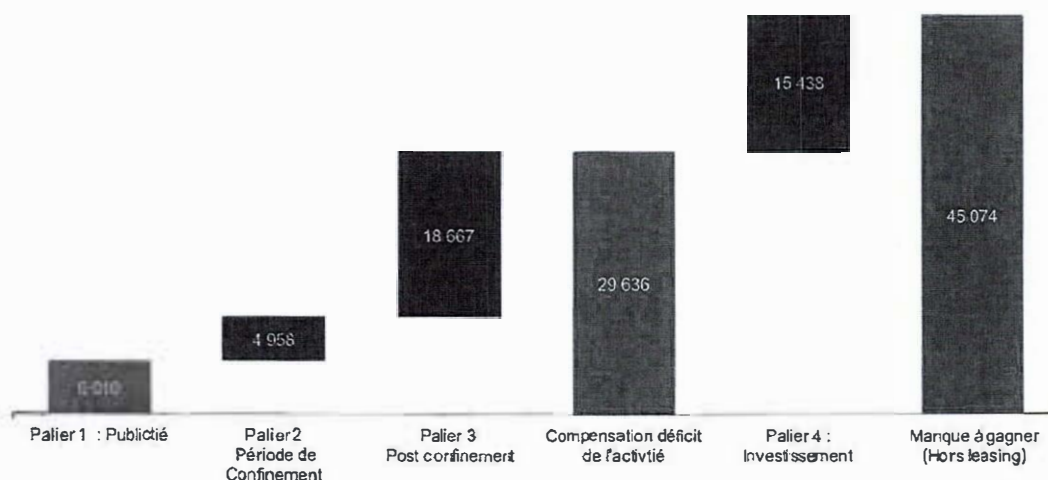


Figure 9 : Calcul de la compensation par palier

- 1^{er} palier : correspond principalement aux revenus de publicité non réalisés par la société durant la période considérée pour un montant de 6 MMAD ;
- 2^{ème} palier : Période de confinement marquée par les limitations de déplacement de la population et ainsi l'arrêt de 65% de la flotte. La compensation est calculée dans ce cas d'espèce en fonction de l'EBITDA non généré par la société durant cette période.
- 3^{ème} palier : Période Post-Covid : durant cette phase la société a vu sa capacité de transport limitée à 75% de l'occupation des bus en plus des pertes réalisées avec la fermeture des écoles et universités.
- 4^{ème} palier : Correspond à la compensation des imprévus en matière d'investissement

A cet effet, la compensation est estimée à :

- Plus de 23,6 MMAD pour les déficits générés par les faibles réalisations de l'activité
- Plus de 15,4 MMAD d'imprévus en matière d'investissements ;
- Plus de 6 MMAD de manque à gagner sur les revenus de publicité non réalisés par la société.

Calcul de la compensation		2019	2020	2021	Total
Produits de Publicité	(1)	1 184	3 606	1 220	6 010
Manque à gagner en terme d'EBITDA	(2)		17 151	6 474	23 626
Dépassement en Investissement	(3)	15 438			15 438
Manque à gagner		16 623	20 757	7 694	45 074

Tableau 10 : Calcul de la compensation par année

Il convient de préciser par ailleurs que nous n'avons pas pris en considération dans le cadre cette compensation les éléments suivants :

- La compensation correspondant au manque à gagner se rattachant aux faibles réalisations en matière de vente des abonnements et des autres recettes (Déphasage entre les réalisations et les hypothèses du BP sur la période Septembre 2019 à Mars 2020) estimé à 8,5 MMAD.
- L'impact des changements de fréquentation des trafics entre les lignes urbaines et régionales pour les raisons exposées ci-dessus.

Annexe 1


Analyse des réalisations VS prévisions

Analyse des Réalisations Vs prévisions En KMAD	Sept - Dec 2019			FY 2020			Janv-Avr 2021			Total sur 2020 Mois		
	YTD BP	YTD Réel	Gap	YTD BP	YTD Réel	Gap	YTD BP	YTD Réel	Gap	YTD BP	YTD Réel	Gap
Produits d'exploitation	98 117	84 203	13 914	377 504	214 485	163 019	125 398	87 694	37 704	601 019	386 382	214 636
Ventes de Tickets	79 747	75 621	4 126	329 502	204 228	125 274	106 140	84 068	22 072	515 389	363 916	151 472
Abonnements	11 921	6 726	5 196	28 366	6 403	21 963	12 614	3 279	9 335	52 902	16 408	36 494
Autres recettes	6 449	1 857	4 592	19 636	3 854	15 782	6 644	347	6 296	32 728	6 058	26 670
Charges d'exploitation	(96 670)	(87 574)	(9 096)	(321 809)	(225 955)	(95 854)	(104 338)	(90 701)	(13 637)	(522 818)	(404 230)	(118 588)
Achats consommés	(49 088)	(32 226)	(16 862)	(161 325)	(74 632)	(86 693)	(53 584)	(31 493)	(22 091)	(263 997)	(138 352)	(125 645)
Frais généraux et personne	(47 582)	(55 058)	7 475	(160 485)	(150 923)	(9 562)	(50 754)	(58 758)	8 004	(258 821)	(264 739)	5 918
Charges de personne	(39 009)	(37 110)	(1 899)	(122 778)	(98 465)	(24 313)	(39 076)	(35 964)	(3 112)	(200 863)	(171 539)	(29 324)
Frais Généraux	(7 736)	(4 630)	(3 106)	(35 018)	(13 763)	(21 255)	(10 769)	(5 748)	(5 021)	(53 522)	(24 141)	(29 381)
Leasing	-	(12 524)	-	-	(36 654)	-	-	(16 372)	16 372	-	(65 550)	65 550
Impôts et taxes	(837)	(794)	(43)	(2 689)	(20 41)	(648)	(910)	(675)	(235)	(4 436)	(3 510)	(926)
Entretien	-	(250)	290	-	(400)	400	-	(449)	449	-	(1 139)	1 139
EBITDA	1 447	(3 371)	(4 817)	55 694	(11 470)	(67 164)	21 059	(3 007)	(24 067)	78 200	(17 848)	(96 048)
EBITDA hors leasing	1 447	9 153	7 707	55 694	25 184	(30 511)	21 059	13 365	(7 694)	78 200	47 702	(30 498)

Annexe 2

Analyse des taux de réalisation mensuels par activité

Taux de réalisation mensuel par produit

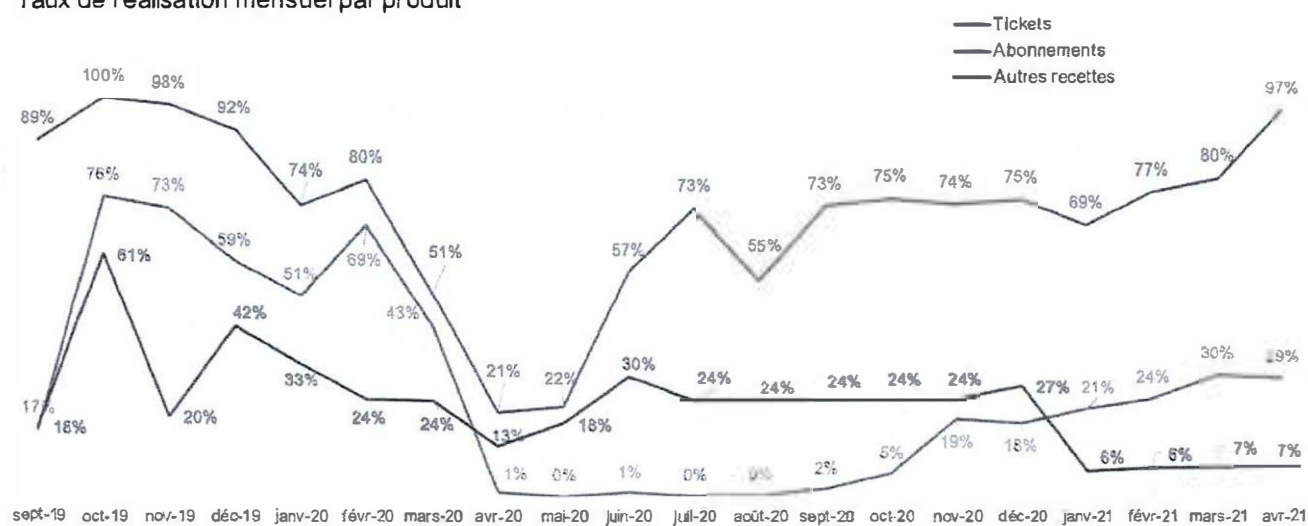

Annexe 3

Comparatif des hypothèses prévisionnelles avec les données du SPC

Comparatif	Les données SPC			Prévisionnel - Annexe 3			Réalisation sur 12 mois (*)		
Année	2 014	2 015	2 016	2 019	2 020	2 021	2 019	2 020	2 021
Nombre de passagers	86 030	73 249	58 354	71 194	93 325	97 351	55 558	47 445	59 636
% d'évolution		(0)	(0)	22%	31%	4%		-15%	26%
Tickets (En Milliers)	62 907	58 163	46 966	54 899	75 126	78 854	51 451	46 454	57 415
% d'évolution		-8%	-19%	17%	37%	5%		-10%	24%
Abonnements (En Milliers)	23 123	15 086	11 389	16 295	18 198	18 497	4 107	991	2 222
% d'évolution		-35%	-25%	43%	12%	2%		-75%	124%
Nb d'abonnés	131 747	142 988	119 970	203 685	215 582	229 344	75 666	24 911	38 250
		9%	-16%	70%	6%	6%			
Nb de voyages Service spéciaux	1 304 470	1 400 515	1 434 929	1 434 929	1 434 930	1 434 931	NC	NC	NC
		7%	2%	0%	0%	0%			
Bus	357	314	274	350	380	380			
Chiffre d'affaires (En Kmad)	251 833	235 701	197 003	326 604	429 850	450 881	252 610	214 485	263 081
% d'évolution		-6%	-16%	66%	32%	5%		-15%	23%
CA Tickets	220 727	204 081	164 792	274 494	375 632	394 271	226 863	204 228	252 203
% d'évolution		-8%	-19%	67%	37%	5%		-10%	23%
CA Abonnements	17 772	17 623	14 697	30 553	32 337	34 402	20 177	6 403	9 837
% d'évolution		-1%	-17%	108%	6%	6%		-68%	54%
CA Service spéciaux	12 758	12 960	15 325	18 004	18 275	18 549	5 571	3 854	1 041
		2%	18%	17%	1%	1%		-31%	-73%
Publicité	576	1 037	2 189	3 553	3 606	3 660			

Source : Management de la société

(*) Pour un souci de comparabilité nous avons estimé les réalisations sur 12 mois pour les exercices 2019 et 2020, dont les comptes sont arrêtés sur une période de 4 mois.

Annexe 4

Calcul du TRI induit

TRI recalculé	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Résultat d'exploitation	593 134	(35 863)	(106 687)	(102 316)	(66 061)	(39 940)	(79 049)	96 082	87 108	115 368	110 719	110 272	112 121	108 560	104 402	107 050	71 368
Leasing	98 294	12 524	36 654	4 9117													
Dotation aux amortissements	855 468	46 569	137 448	135 525	143 913	157 549	184 336	7 715	6 815	6 815	6 815	6 815	4 336	2 950	2 950	2 950	1 967
Subvention	150 000	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000										
EBE	1 396 896	13 230	37 415	52 326	47 851	87 609	85 287	103 797	93 923	122 183	117 534	117 087	116 457	111 511	107 353	110 000	73 333
IS sur REX (Cofisation min)	(253 216)	(667)	(1 093)			(27 235)	(29 736)	(28 659)	(26 885)	(22 129)	(35 190)	(36 086)	(35 890)	(34 357)	(33 068)	(32 842)	(21 895)
Investissements	(758 069)	(542 594)	(14 407)	(60 667)													
Variation de BFR	(32 203)	(39 882)	3 095	99 880	27 377	(622)	24 05	(42 87)	(432)	(27 902)	(225)	(236)	(253)	(600)	(516)	(63)	(42)
Flux annuels	353 407	(569 913)	25 010	1 638	75 229	59 752	57 955	69 851	66 606	45 267	82 119	80 765	80 313	76 554	73 769	77 095	51 396

TRI projet Calculé 5,9%

TRI projet BP 9,9%

Variation de TRI 4,9%

www.mazars.com

Mazars Audit et Conseil

101, Boulevard Abdelmoumen

Casablanca

Tel. +212 (0) 5 22 423 423

Fax +212 (0) 5 22 423 400

